

Kvalitetssikring – Tagdækning

Generelle oplysninger

Bygherre/Kunde:

Adresse:

Postnr./By:

Tlf.:

Udførende:

Adresse:

Postnr./By:

Tlf.:

Projektoplysninger

Projektnavn:

Adresse:

Postnr./By:

VMZINC overflade:

NATUR ☐

QUARTZ-ZINC ☐

ANTHRA ZINC ☐

ZINC PLUS ☐

AZENGAR ☐

PIGMENTO ☐

Materialetykkelse:

0,65 mm ☐

0,7 mm ☐

0,8 mm ☐

Modtagelse og opbevaring

Varerne er kontrolleret for skade ved modtagelse ☐

Varerne er korrekt opbevaret ☐

Tagdækning

Underkonstruktion:

Ventileret konstruktion ☐

Ikke ventileret konstruktion ☐

Underkonstruktion:

Bræddeunderlag ☐ Krydsfinerunderlag ☐ Andet _____
(Spredt forskalling)

Struktureret skillelag:

VM DELTA ☐ VM DELTA TRELA PLUS ☐ DELTA ENKA VENT ☐ Andet _____

Zinkbeklædning:

Taghældning _____ grader

Banelængde _____ m. _____ m. _____ m. _____ m.
Banebredde c/c _____ mm _____ mm _____ mm _____ mm
false

Fastzone nr. anvendt (Se bilag 1) _____

Antal hafter pr m2 _____ stk.

Baner over 10 m anvendes lange glidehafter ☐

Ekspansion ved tagfod og størrelse på fodblik (beregnet) _____ mm

Angivelse af tværsamlinger:

Ingen tværsamling ☐


Enkeltfals ☐

Overløbsfals med påloddet hagekant ☐


Dobbeltfals ☐

Dato og underskrift: _____


Bilag 1: Fastzone nr.

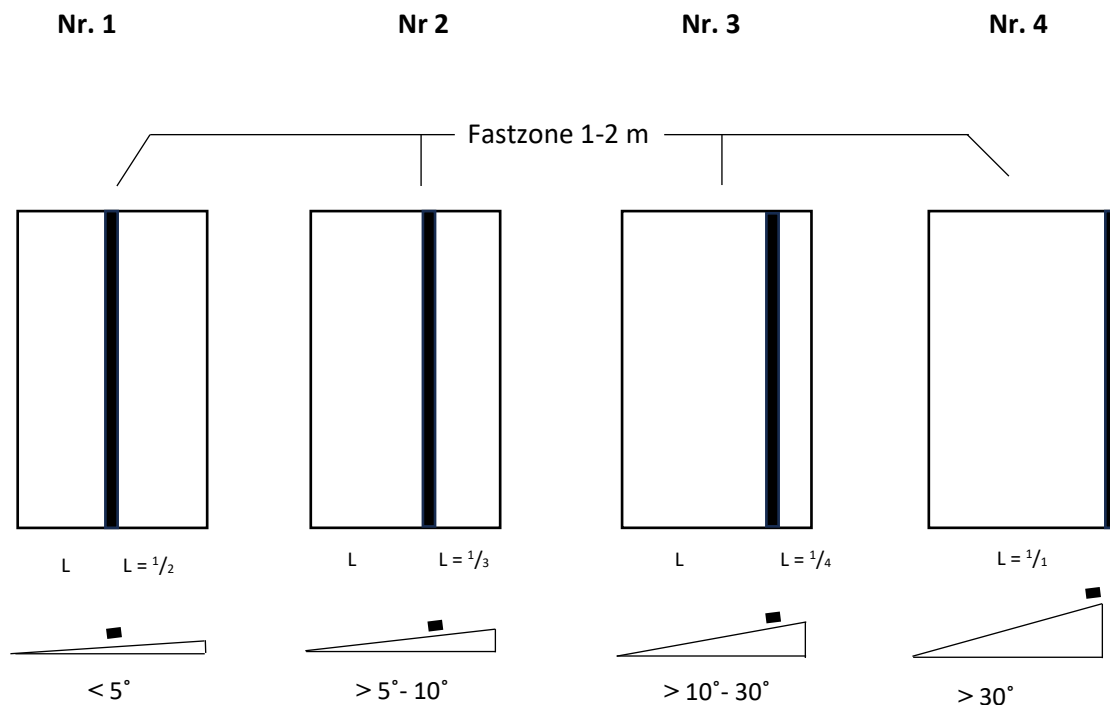

Bilag 2: Fastzone ved buet tag

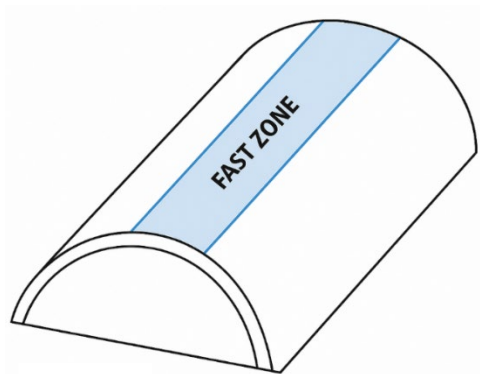

Bilag 3: Randzoner

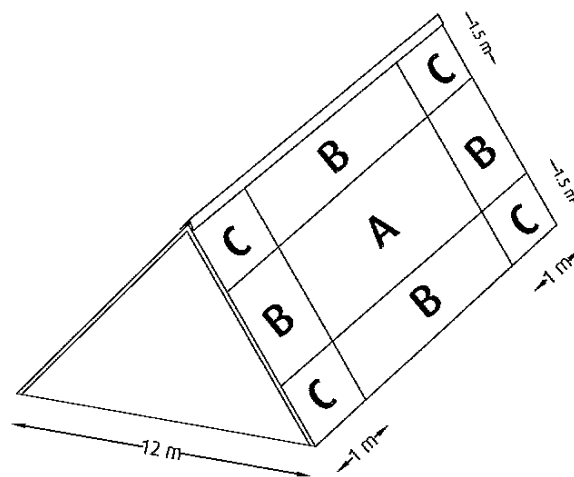

A = Fastzone
B = Randzone
C = Hjørnezone
